

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Data: 04 de janeiro de 2024

Assunto: Relatórios de Execução Relativos aos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia para 2023

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geralcmi@cm-ilhavo.pt
www.cm-ilhavo.pt
+(351) 234 329 600

NIPC: 506 920 887

Considerando:

1. A Celebração dos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia para 2023, que foi concretizada, através da assinatura dos mesmos, no passado dia 17 de maio;
2. Que, no mesmo dia, cada Junta de Freguesia recebeu 50% dos valores protocolados para os trabalhos a realizar, conjuntamente com o valor complementar para aplicar no âmbito de trabalhos relacionados com a sustentabilidade ambiental;
3. Que os restantes 50% foram transferidos durante o mês de outubro;
4. Que a alínea b), do número 3, da Cláusula 5ª dos referidos protocolos estabelece a obrigatoriedade de desenvolvimento de Relatórios de Execução;
5. Que a referida alínea estabelece como data limite para a entrega do último relatório o dia 20 de dezembro de 2023;
6. Que o número 4. da Cláusula 6.ª, indica expressamente que os relatórios são objeto de aprovação em Reunião de Câmara, para serem posteriormente remetidos à Assembleia Municipal para conhecimento;

Remetem-se:

À Câmara Municipal, para os devidos efeitos, e em anexo à presente informação, todos os elementos recebidos, por parte das Juntas de Freguesia, relativos aos últimos Relatórios de Execução desenvolvidos por cada uma das Juntas de Freguesia.

Dos relatórios recebidos temos a informar o seguinte:

1. Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo:
 - a. no ponto 2. apresenta os trabalhos realizados até à data de 20 de dezembro, indicando que, no que respeita aos trabalhos de construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados, todos os trabalhos transitarão para 2024;

- b. no ponto 2., à semelhança do relatório anterior, remete a tabela em anexo, não a integrando no texto;
- c. no ponto 3. indica a previsão de despesas, à semelhança do relatório anterior, não indicando as despesas realizadas, conforme deveria constar com a apresentação da tabela que é remetida em anexo;
- d. a tabela remetida em anexo, relativa ao ponto 3., apresenta os valores aplicados na coluna dos valores orçamentados, contudo é possível depreender os valores investidos, até porque estão devidamente organizados por tarefa e/ou equipamento;
- e. no ponto 4. não são listadas as vias intervencionadas no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio fornecidas pelo Município de Ílhavo, indicando que foram consumidas cerca de 4 toneladas de tapete, sem especificar onde, e mencionando que, atualmente os trabalhos se encontram limitados por falta de Recursos Humanos;
- f. no ponto 5., relativo ao balanço dos trabalhos realizados, refere o seguinte:
- i. o valor investido na reabilitação do caminho do Praião já foi ultrapassado;
 - ii. o Parque Infantil apesar de ainda não se encontrar concluído, também já ultrapassou o valor previsto de investimento, documentando com fotografias;
 - iii. a execução dos trabalhos relativos aos espaços para colocação de contentores RSU indiferenciados será remetida para o primeiro trimestre de 2024;
- g. remete, em anexo, as faturas das despesas realizadas pela Junta de Freguesia no âmbito do Contrato Interadministrativo;
- h. face aos valores totais previstos no Contrato Interadministrativo celebrado entre ambas as autarquias, **a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo apresenta uma taxa de execução de 97%**, no entanto por ainda não ter terminado a execução de todos os trabalhos, prevê-se vir a ultrapassar os 100%, já que para as tarefas já iniciadas apresenta um investimento adicional de €3.155,06, assumido pela Junta de Freguesia, concretamente:

Obras	Contrato - Investimentos Previstos				Execução a 20.12.2023						
	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%	Valor Total	taxa execução	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Parque Infantil	14 500,00 €	2 020,00 €	6%	12 480,00 €	94%	16 841,49 €	116%	4 361,49 €	26%	12 480,00 €	74%
Reabilitação Caminho do Praião	7 250,00 €	1 250,00 €	23%	6 000,00 €	77%	8 063,57 €	111%	2 063,57 €	26%	6 000,00 €	74%
Total	21 750,00 €	3 270,00 €	15%	18 480,00 €	85%	24 905,06 €	115%	6 425,06 €	26%	18 480,00 €	74%
Valor Complementar: Construção, Melhorar e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	4 000,00 €	0,00 €		4 000,00 €		0,00 €	0%	0,00 €	0%	4 000,00 €	
Total (Inclusivo de Apoio Financeiro)	25 750,00 €	3 270,00 €	13%	22 480,00 €	87%	24 905,06 €	97%	6 425,06 €	26%	22 480,00 €	90%

2. Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação:

- a. no ponto 2. apresenta a tabela com a indicação dos trabalhos a realizar, os prazos, data de término e, quando aplicável, referencia, quais os que irão transitar para o ano 2024;
- b. no ponto 3. indica os valores aplicados, por trabalho específico, em cada uma das intervenções, incluindo a informação relativa à percentagem de investimento e de financiamento, por cada autarquia, por obra;
- c. no ponto 4., lista as vias intervencionadas no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio fornecidas pelo Município de Ílhavo;
- d. no ponto 5. apresenta um balanço de todos os trabalhos realizados, documentando-os com fotografias;
- e. remete, em anexo, as faturas das despesas realizadas pela Junta de Freguesia no âmbito do Contrato Interadministrativo;
- f. face aos valores totais previstos no Contrato Interadministrativo celebrado entre ambas as autarquias, a **Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação apresenta uma taxa de execução de 127%** que, não obstante não ter ainda concluído todas as obras previstas, se reflete num investimento adicional de €13.804,79, assumido pela Junta de Freguesia, concretamente:

Obra	Contrato - Investimentos Previstos				Execução a 20.12.2023					
	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%	Valor Total taxa execução	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Conclusão Parque Autocaravanas (Costa Nova do Prado)	24 000,00 €	1 500,00 €	6%	22 500,00 €	94%	27 571,13 €	5 071,13 €	18%	22 500,00 €	82%
Aumento da Calçada e Obras Complementares no Cemitério	11 000,00 €	2 500,00 €	23%	8 500,00 €	77%	19 030,76 €	10 530,76 €	55%	8 500,00 €	45%
Construção e Manutenção Passelos	5 000,00 €	1 000,00 €	20%	4 000,00 €	80%	6 574,79 €	2 574,79 €	39%	4 000,00 €	61%
Manutenção de Caminhos	5 000,00 €	1 600,00 €	32%	3 400,00 €	68%	5 181,58 €	1 781,58 €	34%	3 400,00 €	66%
Total	45 000,00 €	6 600,00 €	15%	38 400,00 €	85%	58 358,26 €	19 958,26 €	34%	38 400,00 €	66%
Valor Complementar: Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	6 000,00 €	0,00 €		6 000,00 €		6 448,53 €	448,53 €	7%	6 000,00 €	93%
Total Protocolo de Apoio Financeiro	51 000,00 €	6 600,00 €	13%	44 400,00 €	87%	64 804,79 €	20 404,79 €	31%	44 400,00 €	69%

3. Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré:

- a. no ponto 2. apresenta a tabela com a indicação do término dos trabalhos já concluídos, e indicando os que estão ainda por terminar, dando informação que alguns transitarão para o primeiro trimestre de 2024;
- b. no ponto 3., sobre a tabela remetida, verifica-se uma incongruência entre os valores aplicados, os investidos pela junta de Freguesia e os investidos pelo Município;
- c. no ponto 4., relativo à lista de vias intervencionadas no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio fornecidas pelo Município de Ílhavo, é dada indicação de que foram levantadas pela Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré um total de 19 toneladas, não indicando, contrariamente ao previsto no contrato, qualquer via onde o material tenha sido aplicado,

por alegação de uma ausência de resposta do Município sobre um acidente ocorrido numa das vias da freguesia;

- d. no ponto 5. apresenta um pequeno balanço, por obra, no qual a informação constante não corresponde aquela que é retirada da leitura da tabela apresentada em 3., e remete fotografias relativas aos diversos trabalhos realizados;
- e. ainda no ponto 5. não é efetuada qualquer referência acerca da aplicação do valor excedente do financiamento do Município de Ílhavo para a intervenção na cobertura do Edifício da Junta de Freguesia, conforme possibilidade prevista na Cláusula 8.^a do Contrato Interadministrativo, que prevê a redistribuição de verba ou a sua aplicação em novos projetos;
- f. nas alíneas a) e b) do mesmo ponto, são mencionadas taxas de esforço por parte da Junta de Freguesia, relativamente aos investimentos previstos, que não estão de acordo com os valores apresentados na tabela do ponto 3., concretamente na distribuição dos valores aplicados nas diferentes tarefas por cada uma das obras, bem como pelas faturadas remetidas;
- g. na alínea f) do ponto 5. referencia que a obra de passeios na Rua Afonso de Albuquerque transitará para 2024, conforme acordado com o Município;
- h. remete, em anexo, as faturas das despesas realizadas pela Junta de Freguesia no âmbito do Contrato Interadministrativo;
- i. face aos valores totais previstos no Contrato Interadministrativo celebrado entre ambas as autarquias, **a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré apresenta uma taxa de execução de 52%**, concretamente:

Obra	Contrato - Investimentos Previstos					Execução a 20.12.2023					
	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%	Valor Total	taxa execução	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Reabilitação da Capela das Almas (Cemitério)	13 000,00 €	3 000,00 €	23%	10 000,00 €	77%	8 282,44 €	64%	0,00 €	0%	10 000,00 €	121%
Iluminação Autossuficiente (Cemitério)	10 000,00 €	1 000,00 €	10%	9 000,00 €	90%	11 650,57 €	117%	2 650,57 €	23%	9 000,00 €	77%
Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais e limpeza e/ou manutenção de valas hidráulicas	7 000,00 €	3 500,00 €	50%	3 500,00 €	50%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	3 500,00 €	
Renovação do Telhado do Edifício da Junta de Freguesia	35 000,00 €	2 000,00 €	6%	32 940,00 €	94%	30 067,88 €	86%	0,00 €	0%	32 940,00 €	110%
Tramo de Passeios - Rua Padre Américo	17 500,00 €	2 500,00 €	14%	15 000,00 €	86%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	15 000,00 €	
Tramo de Passeios - Rua Afonso Albuquerque	18 000,00 €	3 000,00 €	17%	15 000,00 €	83%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	15 000,00 €	
Total	100 600,00 €	15 060,00 €	15%	85 440,00 €	85%	60 000,89 €	60%	2 650,57 €	5%	85 440,00 €	174%
Valor Complementar:											
Construção, Manutenção e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	5 000,00 €	0,00 €		5 000,00 €		4 700,00 €	95%	0,00 €	0%	5 000,00 €	105%
Total Proposto de Apoio Financeiro	105 600,00 €	15 060,00 €	14%	90 440,00 €	85%	54 760,89 €	52%	2 650,57 €	5%	90 440,00 €	166%

4. Junta de Freguesia de São Salvador:

- a. apresenta, no ponto 2., indicação do término dos trabalhos concluídos e indicando a previsão de término dos restantes no final de janeiro de 2024;
- b. no ponto 3., indica os valores aplicados, por trabalho específico, em cada uma das intervenções, no entanto repete os valores aplicados na coluna dos valores orçamentados;

- c. no ponto 4., lista as vias intervencionadas no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio fornecidas pelo Município de Ílhavo, complementando com fotografias de algumas dessas vias;
- d. no ponto 5. apresenta um balanço de todos os trabalhos realizados, documentando-os com fotografias;
- e. remete, em anexo, as faturas das despesas realizadas pela Junta de Freguesia no âmbito do Contrato Interadministrativo;
- f. face aos valores totais previstos no Contrato Interadministrativo celebrado entre ambas as autarquias, a **Junta de Freguesia de São Salvador apresenta uma taxa de execução de 139%** que, não obstante não ter ainda concluído todas as obras previstas, se reflete num investimento adicional de €47.449,68, assumido pela Junta de Freguesia, concretamente:

Obra	Contrato - Investimentos Previstos				Execução a 20.12.2023						
	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%	Valor Total taxa de execução	Investimento JF	%	Apoio CMI	%	
Envolve Capela Léguas	29 500,00 €	6 500,00 €	22%	23 000,00 €	78%	32 116,89 €	109%	9 116,89 €	28%	23 000,00 €	72%
Parque da Murteira	13 500,00 €	2 000,00 €	15%	11 500,00 €	85%	17 244,47 €	128%	5 744,47 €	33%	11 500,00 €	67%
Parque de Lazer da Coutada	8 000,00 €	1 300,00 €	15%	7 500,00 €	85%	18 564,09 €	211%	11 064,09 €	80%	7 500,00 €	40%
Manutenção de Caminhos - Nivelamento e Reposição de Pisos	7 000,00 €	1 000,00 €	14%	6 000,00 €	86%	8 505,47 €	122%	2 505,47 €	29%	6 000,00 €	71%
Reformulação de Caminhos	11 800,00 €	800,00 €	7%	11 000,00 €	93%	12 261,00 €	104%	1 261,00 €	10%	11 000,00 €	90%
Parque Canino	10 500,00 €	1 500,00 €	14%	9 000,00 €	86%	13 708,19 €	131%	4 708,19 €	34%	9 000,00 €	66%
Proteção Margens da Ria	8 000,00 €	1 000,00 €	13%	7 000,00 €	88%	8 313,93 €	104%	1 313,93 €	16%	7 000,00 €	84%
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas	7 000,00 €	1 000,00 €	14%	6 000,00 €	86%	8 246,17 €	118%	2 246,17 €	27%	6 000,00 €	73%
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia	9 500,00 €	1 500,00 €	16%	8 000,00 €	84%	32 383,64 €	341%	24 383,64 €	75%	8 000,00 €	25%
Construção de Passeios	8 500,00 €	1 500,00 €	18%	7 000,00 €	82%	8 947,36 €	105%	1 947,36 €	22%	7 000,00 €	78%
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira	2 500,00 €	820,00 €	33%	1 680,00 €	67%	2 513,07 €	101%	833,07 €	33%	1 680,00 €	67%
Total	116 600,00 €	18 920,00 €	16%	97 680,00 €	84%	162 806,68 €	140%	66 126,68 €	40%	97 680,00 €	60%
Valor Complementar: Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de lixo	5 000,00 €	0,00 €	0%	5 000,00 €	100%	6 243,00 €	125%	1 243,00 €	20%	5 000,00 €	80%
Total Protocolo de Apoio Financeiro	121 600,00 €	18 920,00 €	16%	102 680,00 €	84%	169 049,68 €	139%	68 369,68 €	35%	102 680,00 €	61%

Documentos que acompanham a proposta:

- Dossier 1 – Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo:

Relatório de Execução – dezembro 2023;

Faturas das despesas realizadas;

Tabelas;

- Dossier 2 – Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação:

Relatório de Execução – dezembro 2023 – com faturas das despesas realizadas;


- Dossier 3 – Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré:

Relatório de Execução – dezembro 2023 – com faturas das despesas realizadas;

- Dossier 4 – Junta de Freguesia de São Salvador:
 - Relatório de Execução – dezembro 2023;
 - Faturas das despesas realizadas.

Ílhavo, 04 de janeiro de 2024,

O Vice-Presidente e Vereador da Câmara Municipal com competências delegadas,



João Diogo da Silva Semedo

Despacho

Remeta-se à Câmara para aprovação para posterior remessa à Assembleia Municipal para conhecimento.

Ílhavo, 05 de janeiro de 2024.

O Presidente da Câmara Municipal,



João António Filipe Campolargo

Deliberação

Deliberado unanimidade, aprovar o presente proposta.

Ílhavo, 11 de janeiro de 2024.

O Presidente da Câmara Municipal,



João António Filipe Campolargo





**Junta de
Freguesia da
Gafanha do
Carmo**

Rua da Igreja nº4
3830-408 Gafanha do
Carmo
juntacarmo@gmail.com
+(351) 234 391131

NIPC: 510 833 179

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2023, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto de Contrato Interadministrativo para 2023.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

a) Serão terminados antes do ano civil, sem previsão de datas:

- **Parque Infantil**

- Já executado até à data de 20 de dezembro:

- Demolição das casas de banho
- Limpeza do terreno
- Desvio de tubos de água
- Montagem do Parque Infantil
- Fossa séptica
- Muros e gradeamento
- Passeios em volta
- Piso de areia

- **Reabilitação Caminho do Praiã**

- Já executado até à data de 20 de dezembro:

- Colocação de tout-venant e pó de pedra
- Limpeza da vala em toda a extensão do Caminho
- Colocação de separadores de via
- Pintura dos separadores de via

- **Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados.**

- Já executado até à data de 20 de dezembro:

- Nada executado

b) Transitarão para o próximo ano civil.

- Todo o serviço relacionado com a construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores.

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas).

- Parque Infantil **14500€;**



- Reabilitação Caminho do Praião **7250€**;
- Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados **4.000€**.

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- Felizmente poucas intervenções durante o ano. Cerca de 4 toneladas de tapete. Atualmente estamos com alguma necessidade de intervenção, mas estamos limitados pela falta do colaborador, que se encontra a recuperar da cirurgia.

Ponto 5. (Balanço Final, pela Junta de Freguesia, dos Trabalhos Relativos ao Protocolo de Apoio Financeiro. Neste ponto devem ser incluídas fotografias de todas as tarefas realizadas.)

- A 20 de dezembro estamos com mais de 100% de execução na **Reabilitação do Caminho do Praião**. Colocámos mais pó de pedra, sendo este um trabalho contínuo e devido às chuvas já está a precisar de mais uma correção nos buracos. No **Parque infantil**, também já esgotámos a verba, estando a faltar colocar a porta de entrada e a rampa de acesso. Na **construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados** ainda não foi feita qualquer tipo de intervenção. Prevíamos tratar desta obra a partir de 1 de novembro, mas tal não foi possível. Temos um colaborador que sofreu uma intervenção cirúrgica e ainda não regressou ao serviço. No entanto achamos que no primeiro trimestre do próximo ano, conseguiremos executar.

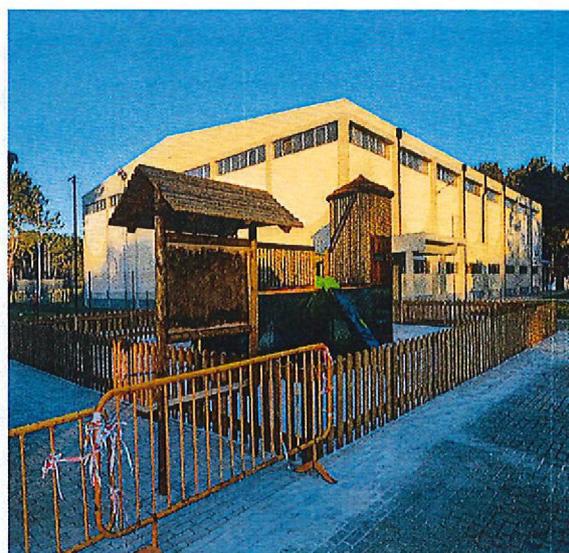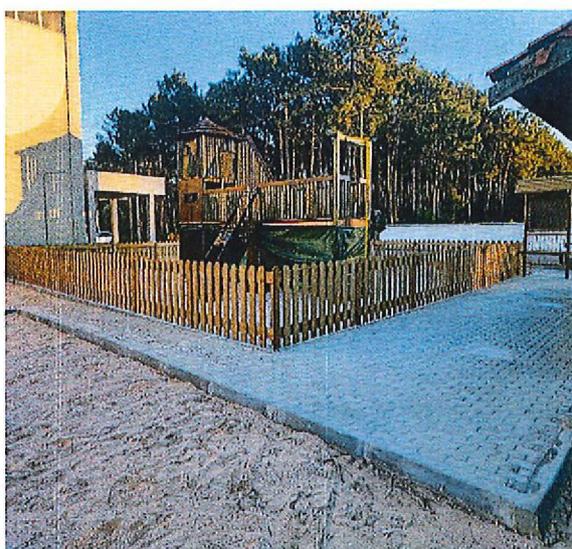


Ponto 6. Anexos ao relatório – todas as faturas relativas à aquisição de bens e serviços (âmbito do Protocolo).

- Documentos em anexo.

Gafanha do Carmo, 20 de dezembro de 2023

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo,



Luís Carlos Cardoso Diamantino

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Total e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Parque Infantil		14 500,00 €			
	Limpeza do espaço	599,83 €			
	Aquisição Parque	11 742,33 €		2 020,00 €	12 480,00 €
	Desvio de tubos de água	186,59 €			
	Muros	185,73 €			
	Nova fossa septic	78,14 €			
	Passeios exterior	206,02 €			
	Rampa de acesso	322,32 €			
	Piso inferior	580,73 €			
	Pavé	480,00 €			
	Mão-de-obra	2 460,00 €			
	TOTAIS PARCIAIS	16 841,49 €	0,00 €	2 020,00 €	12 480,00 €
Reabilitação Caminho do Pralão		7 250,00 €			
	Tout-venant e pó de pedra	306,15 €			
	Limpeza da vala	5 189,06 €			
	Separadores de via de cimento	605,21 €		1 250,00 €	6 000,00 €
	Tinta dos separadores de via de cimento	147,55 €			
	Pó de pedra na rua dos prazeres	585,80 €			
	Mão-de-obra	1 250,00 €			
	TOTAIS PARCIAIS	8 063,57 €	0,00 €	1 250,00 €	6 000,00 €
Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados		4 000,00 €			
		0,00 €			
		0,00 €			
	...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
Execução, pelos serviços da Junta da Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal		0 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL		24 905,06 €	0,00 €	3 270,00 €	22 480,00 €

Obra	Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Parque Infantil				
Trabalhos Específicos	Demolição das casas de banho (CMI)	17/07/2023		21/07/2023
	Limpeza do espaço	18/08/2023		18/08/2023
	Desvio de tubos de água	18/08/2023		18/08/2023
	Construção Parque	22/08/2023		23/08/2023
	Construção de fossa	24/08/2023		24/08/2023
	Construção muros e gradeamento	28/08/2023		01/11/2023
	Rampa de acesso	27/12/2023	Até final ano	
	Passeios em volla	18/09/2023		08/12/2023
Reabilitação Caminho Pralão				
Trabalhos Específicos	Tout-venant e pó de pedra	01/02/2023	Até final ano	
	Limpeza da vala	22/03/2023		06/04/2023
	Pintura separadores	29/04/2023		03/08/2023
	Aplicar pó de pedra na rua dos Pazeres	14/03/2023		01/11/2023
	...			
Construção, melhoria e Manutenção para colocação de contentores de RSU Indiferenciados				
Trabalhos Específicos	Construção de bases	jan 2024	1º tri. 2024	
	...			
	...			
	...			
	...			



**Junta de
Freguesia
da Gafanha
da
Encarnação**

Rua Professor
Francisco Corujo,
227,3830-524
Gafanha da
Encarnação

jfge1848@gmail.pt
www.jf-
gafencarnacao.pt
+(351) 234 360 298

NIPC: 510 833152

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2023, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto do Contrato Interadministrativo para 2023.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra	Iniciado / A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Conclusão Parque Autocaravanas				
Trabalhos Específicos	Trabalhos Preparatórios	01/06/2023	15/08/2023	16/08/2023
	Instalação Equipamento	10/08/2023	15/08/2023	16/08/2023
	Ajustes Equipamento	10/08/2023	31/01/2024	31/01/2024
	...			
Aumento Calçada e Obras complementares do Cemitério				
Trabalhos Específicos	Trabalhos Preparatórios	01/01/2023	30/10/2023	30/10/2023
	Assentar Calçada	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023
	Ajustes Finais	01/12/2023	15/02/2024	15/02/2024
	...			
Construção e Manutenção de Passeios				
Trabalhos Específicos	Construção Passeios	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023
	...			
Manutenção Caminho Praião				
Trabalhos Específicos	Manutenção Praião	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023
	...			
Construção / Melhoria dos espaços dos contentores RSU				
Trabalhos Específicos	Construção RSU	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023
	...			

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Conclusão Parque Autocaravanas	-	24 000,00 €	27 571,13 €	18,39%	81,61%
	Equipamento Smart	24 071,00 €	24 071,00 €	5 071,13 €	22 500,00 €
	Mão Obra - a contabilizar no final dos trabalhos	1 593,00 €	1 593,00 €		
	Material	1 907,13 €	1 907,13 €		
	...				
TOTAIS PARCIAIS		27 571,13 €	27 571,13 €	N.A.	N.A.
Aumento Calçada e Obras complementares do Cemitério	-	11 000,00 €	19 030,76 €	55,34%	44,66%
	Mão Obra - a contabilizar no final dos trabalhos	1 800,00 €	1 800,00 €	10 530,76 €	8 500,00 €
	Material	11 230,76 €	11 230,76 €		
	Orçamento Calçada	6 000,00 €	6 000,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		19 030,76 €	19 030,76 €	N.A.	N.A.
Construção e Manutenção de Passeios	-	5 000,00 €	6 574,59 €	39,16%	60,84%
	Mão Obra - a contabilizar no final dos trabalhos	2 214,00 €	2 214,00 €	2 574,59 €	4 000,00 €
	Material	4 360,59 €	4 360,59 €		
TOTAIS PARCIAIS		6 574,59 €	6 574,59 €	N.A.	N.A.
Manutenção Caminho Praia	-	5 000,00 €	5 181,58 €	34,38%	65,62%
	Mão Obra - a contabilizar no final dos trabalhos	2 664,00 €	2 664,00 €	1 781,58 €	3 400,00 €
	Material	2 517,58 €	2 517,58 €		
TOTAIS PARCIAIS		5 181,58 €	5 181,58 €	N.A.	N.A.

Construção / Melhoria dos espaços dos contentores RSU	-	6 000,00 €	6 446,53 €	6,93%	93,07%
	Mão Obra - a contabilizar no final dos trabalhos	3 528,00 €	3 528,00 €		
	Material total - a contabilizar oportunamente	2 918,53 €	2 918,53 €	446,53 €	6 000,00 €
TOTAIS PARCIAIS		6 446,53 €	6 446,53 €	N.A.	N.A.
TOTAL		64 804,59 €	64 804,59 €	20 404,59 €	44 400,00 €

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- Rua Professor Francisco Corujo, Rua do Carmo e Rua Padre Resende, Rua Padre Lé, Rua João Carapelho, Zona Industrial da Mota, Rua de Ílhavo, Avenida José Estêvão, Estrada Florestal, Avenida das Bichaneiras, Rua dos Marianos, Rua das Covadas, Rua do Santo Amaro, Rua dos Três Pinheiros, Rua da Quinta, Rua Padre António Diogo, Rua do Carmo, Rua Professor Francisco Corujo com a Rua de Ílhavo, Rua Padre Resende, Rua João Carapelho, Rua Professor Francisco Corujo, Rua dos Bernardos, Rua Entrecampos, Travessa da Escola Sul, Rua do Santo Amaro, Avenida do Mar, Rua Professor Francisco Corujo, Rua Padre Resende, Rua Padre Lé, reparação do pavimento com tapete frio no percurso da Procissão da N^a Sr^a da Encarnação, Rua da Liberdade, Avenida José Estêvão, Rua Arrais Ançã; Reparação de buracos na Travessa dos Extremos (junto ao n^o34), cruzamento da Ria de Ilhavo com a Rua Professor Francisco Corujo, Rua Professor Francisco Corujo (em frente à escola, junto ao n^o2). Colocação de tapete frio em volta da caixa na Rua Nova n^o33;
- Reparação de pequenos buracos em diversas ruas de forma preventiva no seguimento das obras de saneamento.

Ponto 5. Na presente data já se encontra praticamente concluída a obra do Parque das Autocaravanas, estando a sua infraestrutura física concluída aguardando a substituição do leitor de cartões que tem apresentado alguma instabilidade no funcionamento para que se proceda ao pagamento integral do equipamento.

Relativamente às obras no Cemitério, foram concluídos os trabalhos preparatórios do terreno e das infraestruturas subjacentes à futura nova calçada e conseqüentemente novo talhão aguardando o início da empreitada por parte do calceteiro que deverá ocorrer durante o mês de janeiro de 2024.

No que diz respeito aos passeios, foram contruídos/corrigidas algumas zonas de passeios já existentes, sendo construído de raiz duas zonas junto ao largo da Bruxa.


No que diz respeito ao Caminho do Praião a Junta faz um esforço de manutenção regular para se manter em boas condições de circulação de peões e bicicletas.

Relativamente às bases de RSU, foram construídas 20 bases para aplicação em diversas zonas da Freguesia.

Continua a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação empenhada em concretizar ao melhor preço e nas melhores condições, as obras constantes no Contrato de 2023 sem que tal afete o normal funcionamento das restantes funções da Junta de Freguesia, recorrendo sempre que possível, como sempre foi, à mão de obra interna da Junta, quer dos colaboradores quer dos próprios membros do executivo.

De seguida seguem algumas fotos das obras do CIA de 2023:

Sistema do controlo de acessos do Parque de Autocaravanas da Costa Nova

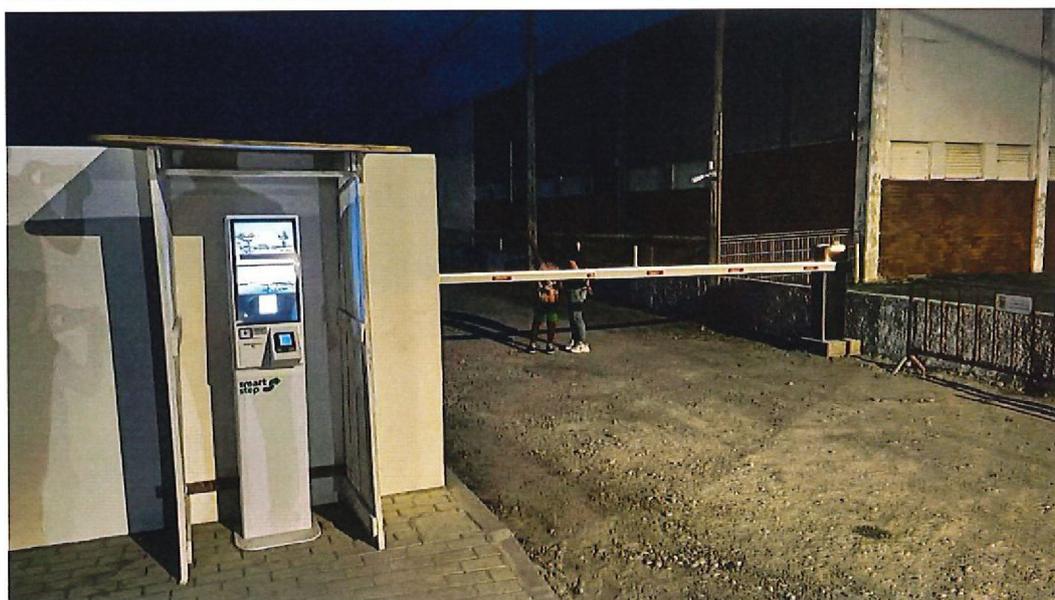

Obra de ampliação da Calçada do Cemitério



Passeios



Caminho do Praião



Bases RSU





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 3 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2023, conforme o seu anexo I.

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av. José Estêvão,
494
3830-556 Gafanha da Nazaré

geral@jf-gafanhadanazare.pt
www.jf-gafanhadanazare.pt
+(351) 234 361 520

NIPC: 510 833 160

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto de Contrato Interadministrativo para 2023.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra	Iniciado / A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Reabilitação da Capela das Almas (Cemitério)				
Trabalhos Específicos	Reabilitação do telhado, pintura exterior paredes	24/07/2023	18/08/2023	
	Pintura interior paredes e piso	18/09/2023	22/09/2023	
	Restauro/substituição do altar		31/10/2023	
	Genúflexório	19/10/2023	19/10/2023	
	Alcalifa		30/10/2023	
	Material diverso		30/10/2023	
Mão-de-obra da Junta de Freguesia			30/10/2023	
Iluminação Autosuficiente (Cemitério)				
Trabalhos Específicos	Aquisição Postes	12/05/2023	30/10/2023	
	Remoção de iluminação existente, execução e colocação de bases	17/07/2023	30/10/2023	
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais e limpeza e/ ou manutenção de valas hidráulicas				
Trabalhos Específicos	...			
	...		Dezembro	
	...			
Renovação do Telhado do Edifício da Junta de Freguesia				
Trabalhos Específicos	Reabilitação da cobertura do edifício sede da Junta de Freguesia	19/07/2023	31/07/2023	
	Trabalhos complementares/extra relacionados com a obra	07/08/2023	21/08/2023	
Tramo de Passeios - Rua Padre Américo				
Trabalhos Específicos	...		Dezembro	
	...			
	...			
Tramo de Passeios - Rua Afonso Albuquerque				
Trabalhos Específicos	...		1º Trimestre 2024	
	...			
	...			
Construção, Melhoría e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos				
Trabalhos Específicos	Colocação de garagens para contentores		Dezembro	
	Colocação bases ecopontos		Dezembro	
	...			

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Reabilitação da Capela das Almas (Cemitério)	-	13 000,00 €	-	-	-
	Reabilitação do telhado, pintura exterior paredes		629,76 €	5 995,77 €	10 000,00 €
	Pintura interior paredes e piso		0,00 €		
	Restauro/substituição do altar		4 000,00 €		
	Genuflexório		1 300,00 €		
	Alcalifa		152,08 €		
	Material diverso		1 100,60 €		
	Mão de Obra da Junta de Freguesia		1 100,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	13 000,00 €	8 282,44 €	5 995,77 €	10 000,00 €
Iluminação Autosuficiente (Cemitério)	-	10 000,00 €	-	-	-
	Aquisição Postes	0,00 €	5 000,00 €	2 650,57 €	9 000,00 €
	Remoção de iluminação existente, execução e colocação de bases	0,00 €	6 650,57 €		
	TOTAIS PARCIAIS	10 000,00 €	11 650,57 €	1 650,57 €	9 000,00 €
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais e limpeza e/ ou manutenção de valas hidráulicas	-	7 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	10 000,00 €	0,00 €		3 500,00 €
Renovação do Telhado do Edifício da Junta de Freguesia	-	35 000,00 €	-	-	-
	Reabilitação da cobertura do edifício sede da Junta de Freguesia		25 892,25 €		
	Trabalhos complementares/extra relacionados com a obra	0,00 €	4 175,43 €	0,00 €	32 940,00 €
	TOTAIS PARCIAIS	35 000,00 €	30 067,68 €	0,00 €	32 940,00 €
Tramo de Passeios - Rua Padre Américo	-	17 500,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	15 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	17 500,00 €	0,00 €		15 000,00 €
Tramo de Passeios - Rua Afonso Albuquerque	-	18 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	18 000,00 €	0,00 €		15 000,00 €
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	-	5 000,00 €	-	-	-
	Colocação bases contentores	0,00 €	4 500,00 €		
	Colocação bases ecopontos	0,00 €	260,00 €		5 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	5 000,00 €	4 760,00 €		5 000,00 €
Execução, pelos serviços da Junta de Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	103 500,00 €	54 760,69 €	7 646,34 €	90 440,00 €

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- a) Foram levantadas 19 toneladas de argamassa de betuminoso a frio para serem colocados nas vias da freguesia;

- b) Não indicamos nenhuma via intervencionada no âmbito de aplicação de argamassas betuminosas a frio fornecidas pelo Município de Ílhavo, por motivo de ausência de resposta escrita do GAJNEF, desde 10/02/2022, relativa ao processo do acidente alegadamente ocorrido em 30/01/2022, na Via da Ria. Após receção dessa comunicação indicaremos as vias intervencionados e com suporte fotográfico.

Ponto 5.

- a) A reabilitação da Capela das Almas no Cemitério da Gafanha da Nazaré dotou o espaço com a dignidade que justamente merece. Uma obra que ultrapassou o valor orçamentado e que implicou uma taxa de esforço de 60% à Junta de Freguesia;
- b) Instalação de iluminação mais eficiente e alimentada por energia de fontes renováveis, no Cemitério da Gafanha da Nazaré veio resolver os problemas elétricos existentes e motivados por uma instalação elétrica antiga e deteriorada, bem como, diminuir os gastos de energia. Uma obra que ultrapassou o valor orçamentado e que implicou uma taxa de esforço de 29,50% à Junta de Freguesia;
- c) Investimentos na manutenção e/ou extensão da rede de águas pluviais e limpeza e/ou manutenção de valas hidráulicas, estão a decorrer, pelo que, serão apresentados os valores no próximo relatório (suplementar);
- d) Reabilitação da cobertura do edifício sede da Junta de Freguesia – retirada da cobertura existente, em fibrocimento, e substituição por painéis tipo sandwich, incluindo todos os remates e capeamentos, veio resolver problemas ambientais e de infiltrações. Uma obra que ficou abaixo do orçamentado e com 0% taxa de esforço para a Junta de Freguesia;
- e) Construção de novos tramos de passeios para colmatação de tramos existentes na rua Padre Américo, no troço entre a rua D. Manuel Trindade Salgueiro e a rua 1º de Maio, está em fase de execução e com previsão de conclusão até 31 de dezembro de 2023, pelo que, serão apresentados os valores no próximo relatório (suplementar);
- f) Construção de novos tramos de passeios para colmatação de tramos existentes na rua Afonso de Albuquerque, no troço entre a rua Santa Mafalda e a rua Camilo Castelo Branco, no lado sul, é uma obra que vai transitar para o primeiro trimestre de 2024, conforme acordado com a Câmara Municipal.
- g) Melhoria e manutenção de espaços para a colocação de pontos de recolha seletivos de resíduos, no âmbito de trabalhos relacionados com a sustentabilidade ambiental. Já foram colocadas 15 garagens de contentores e construída 1 base de ecopontos. Aguardamos informação da Câmara Municipal sobre a proposta de colocação de mais equipamentos, que enviámos a 1 de dezembro de 2023.


Reabilitação da Capela das Almas



Iluminação Autosuficiente Cemitério



Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais e limpeza e/ou manutenção de valas hidráulicas

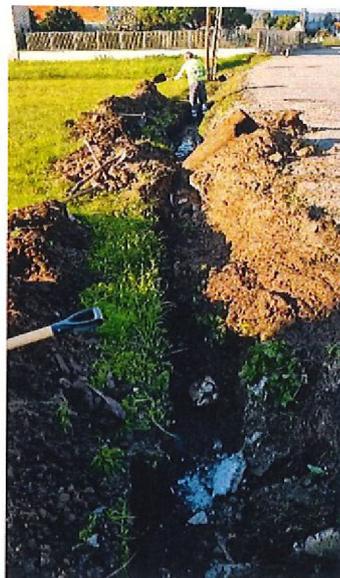



Tramo passeio – rua Padre Américo



Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de ecopontos



Ponto 6. Anexos ao relatório – todas as faturas relativas à aquisição de bens e serviços.
Reabilitação da Capela das Almas



ACORDO COOPERAÇÃO FINANCEIRO ENTRE CMI E JFGN - 2023

TRABALHOS DESEMPENHADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA

OBRA	Capela das Almas		
Descrição	Quant	Unitario	Valor
Mão de obra			
Trabalhos diversos realizados pelos			
Funcionários da Junta de Freguesia			1 100,00 €
TOTAL			1 100,00 €

Gafanha da Nazaré, 20 de Dezembro de 2023

O Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré

Carlos António das Neves Rocha



**Junta de
Freguesia
de São
Salvador**

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ilhavo

geral@freguesiassalva
dor.pt
+(351) 234 321725

NIPC: 510833217

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro para 2023, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente terceiro relatório de execução expor o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia de S. Salvador até ao presente momento e final de ano de 2023.

Este relatório, realça todos os compromissos e trabalhos quem têm vindo a ser realizados, fruto e objeto do Protocolo de Apoio Financeiro para 2023 elaborado e assinado entre ambas as partes.

Neste descritivo, um trabalho ininterrupto desenvolvido pela JFSS fundamentado na responsabilidade, rigor, clareza e dinamismo nas diferentes e principais áreas de atuação/intervenção propostas.

Numa parceria ativa, dialogada e coordenada com a Câmara Municipal de Ílhavo primámos ao longo deste ano com dedicação e empenho privilegiando os objetivos a que nos responsabilizámos a alcançar em prol de uma crescente qualidade de vida da nossa Comunidade, Freguesia e Município.

Ponto 2. No ponto dois apresentamos o rol dos trabalhos baseados na responsabilidade e compromissos assumidos pela Junta de Freguesia de São Salvador para todo este período de execução e relativo a 2023.

Parte dos trabalhos já realizados tiveram início anteriormente à assinatura protocolar dada a necessidade de intervenções ativas e permanentes, servindo-se a Junta de Freguesia de São Salvador com verbas realizadas proveniente de receitas próprias e em prol das necessidades dos nossos fregueses.

A assinatura do protocolo interadministrativo a maio de 2023 embora tardia, veio repor parte o equilíbrio financeiro realizado antecipadamente e doravante dar continuidade aos trabalhos e investimentos a que nos propusemos para este ano sempre com recursos humanos próprios da Junta de Freguesia de São Salvador.



a) Neste terceiro relatório e numa observação contínua esperamos executar todos os objetivos que nos comprometemos até final de 2023 salientando que parte dos trabalhos serão realizados e finalizados no mês de janeiro de 2024 visto a entrega dos equipamentos adquiridos no mês de novembro (dois parques infantis) só nos terem sido entregues no mês de dezembro dada a falta de equipamentos e materiais nas empresas de fornecimento.

Ao presente momento a JFSS já detém os equipamentos em armazém sendo somente necessário aplicá-los no devido local sendo a sua implementação de caráter rápida nos locais pré-definidos.

Também a obra da Légua, terá o seu término durante o mês de janeiro com a restante aplicação do piso pavê e estruturas de embelezamento complementares.

Obra	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Envolvente da capela da Légua	29 500,00 €	6500,00 €	22%	23 000,00 €	78%
Parque Murteira	13 500,00 €	2000,00 €	15%	11 500,00 €	85%
Parques lazer da Coutada	8800,00 €	1300,00 €	15%	7500,00 €	85%
Manutenção dos Caminhos/reposição de pisos	7 000,00 €	1000,00 €	14%	6 000,00 €	86%
Reformulação de caminhos	11 800,00 €	800,00 €	7%	11 000,00 €	93%
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício da Junta de Freguesia	9 500,00 €	1 500,00 €	16%	8 000,00 €	84%
Construção de Passeios	8 500,00 €	1 500,00 €	16%	8 000,00 €	84%
Manutenção de Árvores em Caldeira	2500,00 €	820,00 €	17%	2 500,00 €	83%
Proteção das margens da Ria	8000,00 €	1 000,00 €	13%	7000,00 €	88 %
Parque Canino	10 500,00 €	1 500,00 €	14%	9 000,00 €	86%
Águas Pluviais e Manutenção de valas hidráulicas					
Total	116 600,00 €	18 920,00 €	16%	97 680,00 €	84%
Valor complementar					
Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de Ecopontos	0,00€	0,00€		5000€	
Total	116 600,00 €	18 920,00 €		102 680,00€	84%

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Reformulação de Caminhos / Ecotrilho Gaf.Boavista					
Trabalhos Específicos	Ecotrilho Gafanha Boavista	24 de agosto	31 de dezembro	Terminado	
	Aplicação de estruturas de águas	24 de agosto	31 de dezembro	Terminado	
	Tout venan aplicação	24 de agosto	31 de dezembro	Terminado	
	Condutas de água	12 de setembro	18 de setembro	Terminado	
	Aplicação de estruturas de madeira	13 de novembro	17 de novembro	Terminado	
Parque Canino					
Trabalhos Específicos	Vedação e madeiras diversas	22 de maio	27 de maio	Terminado	
	Equipamentos diversos	30 de junho	4 de julho	Terminado	
	Preparação de espaço jardim /rega	7 de agosto	9 de agosto	Terminado	
	Outros equipamentos	23 de agosto	27 de agosto	Terminado	
Proteção Margens da Ria					
Trabalhos Específicos	Pedra e derivados	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Serviços de maquinaria	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Remoção de inertes	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
Agua Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas, Sinalética					
Trabalhos Específicos	Construção de canaletas de águas pluviais	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Retificação e reposição de tampas	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Intervenções na rede de esgotos	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Implementação de espelhos	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	placas sinalética de localidades	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Pavimentação	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Secções Depósito Resíduos	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Compatação de pisos	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Aplicação de Tout Venant e pó de pedra	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Construção de estruturas	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Substituição Janelas da Sede	14 de novembro	31 de dezembro	Terminado	
	Equipamentos diversos	14 de novembro	31 de dezembro	Terminado	
Construção Passeios					
Trabalhos Específicos	Construção de passeios	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Retificação de passeios	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Alinhamento e correção de passeios	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
Manutenção e Aplicação árvores em Caldeira					
Trabalhos específicos	Aplicação de árvores na Freguesia	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Aplicação de árvores parque canino	27 de setembro	29 de setembro	Terminado	
	Aplicação de árvores parques	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Aplicação de flores	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
Trabalhos específicos	Piso Cimento	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	
	Piso Areia	intervenção contínua	31 de dezembro	Terminado	

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto/Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Envolvente Capela Légua		29 500,00 €	-	-	-
	Obra na Via publica frente á capela da Légua	9 308,68 €	9 308,68 €	6 500,00 €	23 000,00 €
	Materiais Diversos utilizados na obra	668,29 €	668,29 €		
	Gasóleo dispendido	551,51 €	551,51 €		
	Mão de obra Operacionais afetos à execução de obra	2 886,84 €	2 886,84 €		
	Equipamentos adquiridos como complemento à execução	3 258,60 €	3 258,60 €		
	Aquisição e implementação do parque infantil Légua	15 442,97 €	15 442,97 €		
	TOTAIS PARCIAIS	32 116,89 €	32 116,89 €	N.A.	N.A.
Parque da Murteira		13 500,00 €	-	-	-
	Limpeza do Espaço	3 384,76 €	3 384,76 €	2 000,00 €	11 500,00 €
	Remoção de Invasoras	3 690,00 €	3 690,00 €		
	Madeiras para manutenção de parques	5 636,75 €	5 636,75 €		
	Equipamentos de manutenção	464,66 €	464,66 €		
	Manutenção	533,35 €	533,35 €		
	Mão de obra Operacionais afetos à execução	1 603,80 €	1 603,80 €		
	Combustíveis gastos em manutenção do local	725,75 €	725,75 €		
	Serviços Diversos com aquisição e aplicação em metal	1 205,40 €	1 205,40 €		
	TOTAIS PARCIAIS	17 244,47 €	17 244,47 €	N.A.	N.A.
Outros Parques de Lazer		8 800,00 €	-	-	-
	Manutenção parques - limpeza e outras intervenções	788,80 €	788,80 €		
	Equipamentos de madeira	2 279,23 €	2 279,23 €		
	Mão de obra operacionais na execução de trabalhos	712,80 €	712,80 €		
	Combustíveis utilizados na execução	296,03 €	296,03 €		
	Sinalética parques	657,44 €	657,44 €		
	Telas de Sombreamento aplicadas	1 553,00 €	1 553,00 €		
	Parque desportivo / lazer adjacente ao parque canino (Novo)	5 130,00 €	5 130,00 €		
	Aquisição novo parque infantil Coutada para implementação	3 985,20 €	3 985,20 €		
	Aquisição de estruturas proteção para o parque da Coutada	3 161,59 €	3 161,59 €		
	TOTAIS PARCIAIS	18 564,09 €	18 564,09 €	N.A.	N.A.
Manutenção dos Caminhos		7 000,00 €	-	-	-
	Manutenção de caminhos / estradas e aruamentos alcátrão	741,97 €	741,97 €	1 000,00 €	6 000,00 €
	Aplicação Pó de Pedra + Tout Venant	2 931,02 €	2 931,02 €		
	Mão de obra operacionais na execução de trabalhos	2 138,40 €	2 138,40 €		
	Combustíveis gastos em manutenção do local	2 139,67 €	2 139,67 €		
	Arranjos de Equipamentos	555,41 €	555,41 €		
	TOTAIS PARCIAIS	8 506,47 €	8 506,47 €	N.A.	N.A.
Reformulação de Caminhos / Ecotrilho Gaf.Boavista		11 800,00 €	-	-	-
	Ecotrilho Gafanha Boavista sinalética e outros equipamentos	910,20 €	910,20 €	800,00 €	11 000,00 €
	Materiais diversos / cargas de Inertes / outros	8 966,98 €	8 966,98 €		
	Mão de obra operacionais na execução de trabalhos	855,36 €	855,36 €		
	Combustíveis gastos em manutenção do local	1 529,06 €	1 529,06 €		
	TOTAIS PARCIAIS	12 261,60 €	12 261,60 €	N.A.	N.A.
Parque Canino		10 500,00 €	-	-	-
	Vedação e madeiras diversas do espaço	4 103,48 €	4 103,48 €	1 500,00 €	9 000,00 €
	Equipamentos diversos aplicados no local	2 357,93 €	2 357,93 €		
	Preparação de espaço/infraestruturas e limpeza	1 459,04 €	1 459,04 €		
	Materiais/ inertes aplicados	2 081,53 €	2 081,53 €		
	Mão de obra operacionais na execução de trabalhos	2 851,20 €	2 851,20 €		
	Combustíveis gastos em manutenção do local	242,47 €	242,47 €		
	Zonas verdes equipamentos de rega	612,54 €	612,54 €		
	TOTAIS PARCIAIS	13 708,19 €	13 708,19 €	N.A.	N.A.

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Proteção Margens da Ria		8 000,00 €	-	-	-
	Pedra e derivados aplicados nos locais de intervenção	1 369,10 €	1 369,10 €	1 000,00 €	7 000,00 €
	Mão de obra operacionais na execução de obra	2 316,60 €	2 316,60 €		
	Combustíveis gastos na execução de obra	1 601,49 €	1 601,49 €		
	Madeiras para cofragens diversas de proteção	897,56 €	897,56 €		
	Manutenção de máquina giratória	2 129,18 €	2 129,18 €		
TOTAIS PARCIAIS		8 313,93 €	8 313,93 €	N.A.	N.A.
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas, Sinalética		7 000,00 €	-	-	-
	Construção de canaletas de águas pluviais	247,23 €	247,23 €	1 000,00 €	6 000,00 €
	Retificação e reposição de tampas	883,39 €	883,39 €		
	Intervenções na rede de esgotos e Tubos aplicados	323,24 €	323,24 €		
	Aquisição de manilhas de águas pluviais a aplicar	1 041,68 €	1 041,68 €		
	Mão de obra operacionais na execução de obra	1 603,80 €	1 603,80 €		
	Combustíveis gastos na execução de obra	343,64 €	343,64 €		
	Sinalética aplicada no local	3 803,19 €	3 803,19 €		
TOTAIS PARCIAIS		8 246,17 €	8 246,17 €	N.A.	N.A.
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia		9 500,00 €	-	-	-
	Pavimentação	836,06 €	836,06 €	1 500,00 €	8 000,00 €
	Equipamentos aplicados no cemitério	2 906,98 €	2 906,98 €		
	Construção de estruturas / sepulturas	13 568,28 €	13 568,28 €		
	Tintas para manutenções diversas	1 385,47 €	1 385,47 €		
	Manutenção elétrica / canalização e outras	451,41 €	451,41 €		
	Fundações de Betão + Betão de nivelamento	2 595,94 €	2 595,94 €		
	Novas bancas de venda para o mercado de Ilhavo	5 424,30 €	5 424,30 €		
	Novas janelas sede da Junta de Freguesia	5 215,20 €	5 215,20 €		
TOTAIS PARCIAIS		32 383,64 €	32 383,64 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios		8 500,00 €	-	-	-
	Cimento	794,14 €	794,14 €	1 500,00 €	7 000,00 €
	Pavé aplicado na obra	2 562,97 €	2 562,97 €		
	Inertes de compactação utilizados	145,38 €	145,38 €		
	Combustíveis gastos na execução de obra	150,50 €	150,50 €		
	Mão de obra operacionais na execução de obra	3 849,12 €	3 849,12 €		
	Aquisição equipamentos de corte complementares	1 445,25 €	1 445,25 €		
TOTAIS PARCIAIS		8 947,36 €	8 947,36 €	N.A.	N.A.
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira		2 500,00 €	-	-	-
	Árvores	1 801,07 €	1 801,07 €	820,00 €	1 680,00 €
	Mão de obra	712,80 €	712,80 €		
TOTAIS PARCIAIS		#REF!	#REF!	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos		5 000,00 €	-	-	-
	Cimento	494,46 €	494,46 €	-	5 000,00 €
	Arela e Inertes utilizados	271,83 €	271,83 €		
	Mão de obra operacionais na execução de obra	2 423,52 €	2 423,52 €		
	Combustíveis gastos na execução de obra	75,76 €	75,76 €		
	Aquisição equipamentos de corte complementares	477,43 €	477,43 €		
	Pavé, lancil e outros materiais	2 500,00 €	2 500,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		6 243,00 €	6 243,00 €	N.A.	N.A.
TOTAL		169 049,68 €	169 049,68 €	18 920,00 €	102 680,00 €

Ponto 4. No ponto 4, indicamos as vias rodoviárias objeto de intervenção pela Junta de Freguesia de São Salvador, no âmbito de uma maior e melhor manutenção e conservação. De aludir e valorizar a coordenação destas tarefas com a colaboração e interajuda da Câmara Municipal no fornecimento de argamassas betuminosas a frio.

Neste período de intervenção destacamos as vias prioritárias e objeto de intervenção:

- a) Rua Tomé Barros Queiróz;
- b) Rua do Passadouro;
- c) Rua do Casal;
- d) Rua da Coutada;
- e) Rua dos Sucessos;
- f) Rua do Sol;
- g) Rua das Barreiras;
- h) Rua das Moitas;
- i) Rua das Quintãs;
- j) Rua do Urjal;
- k) Rua do Cambarnal;
- l) Rua da Lagoa;
- m) Rua das Barreiras;
- n) Rua das Maltas;
- o) Rua dos Vales;
- p) Rua do Passadouro;
- q) Rua da Azenha;
- r) Rua Tomé Barros Queiroz;
- s) Rua da Lagoa do Junco;
- t) Rua da Barca.





Ponto 5. No ponto 5 expomos a continuidade dos trabalhos a que nos propusemos, destacando uma concretização ativa, rigorosa, estudada e atempada salvaguardando que todos estes trabalhos e obras são realizados com mão de obra unicamente dos operacionais desta Junta de Freguesia.

Assim, destacamos a realização dos seguintes trabalhos na nossa freguesia com recurso ao protocolo estabelecido com a câmara Municipal de Ílhavo:

Cemitérios

- Pinturas e requalificações de estruturas diversas;
- Nivelamento de pisos e cimentados nos cemitérios de Ílhavo e Vale de Ílhavo;
- Melhoria e construção de acessibilidades;

- Ampliação e aumento do número de sepulturas e abertura de fundações nos cemitérios de Ílhavo;
- Implementação de estruturas de betão de apoio às fundações e nivelamento de pisos envolventes com recurso a betão;
- Reestruturação dos sistemas de abastecimento de águas e tubagens de fornecimento;
- Manutenção de wc;
- Aplicação de bancos de descanso em substituição aos deteriorados;
- Implementação de novas papeleiras metálicas;
- Implementação de uma escultura no cemitério em homenagem a todos os Ilhavenses falecidos em Terra e no Mar;
- Reestruturação de jardins e colocação de árvores e arbustos decorativos;
- Lavagem de calçadas e recuperação de passeios diversos;
- Remoção de inertes e terras em excesso nos cemitérios;
- Recolha e separação de lixos.

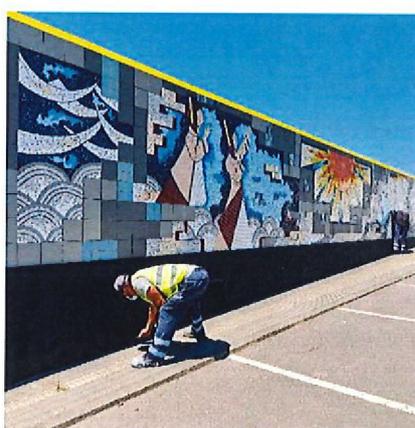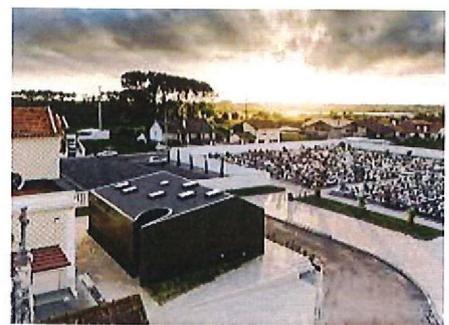

PARQUES E ESTRUTURAS DE LAZER:

- Finalização da reabilitação e substituição de madeiras diversas dos parques da Murteira, Coutada, Sr^a dos Campos, novo parque dos Moitinhos e parque da Folsa dos Coquins;
- Finalização da implementação de miradouros de madeira na frente de ria e novo Eco Trilho da Gafanha da Boavista em construção/requalificação;
- Finalização das manutenções diversas e aquisição de novos parques infantis da JFSS.



Finalização da reparação de margens e caminhos de frente de ria:

- Finalização da reposição e acomodação de pedras na frente de ria;
- Finalização da retificação, nivelção e compactação dos Eco-trilhos da Freguesia;



- Finalização do Eco Trilho da Gafanha da Boavista:

- . Finalização da remoção de excedentes nas laterais do trilho;
- . Finalização da aplicação de novas manilhas de escoamento de águas pluviais;
- . Finalização do aumento da cota do trilho;
- . Finalização da limpeza das valas hidráulicas adjacentes;
- . Finalização da aplicação de sinalética diversa;
- . Finalização da aplicação de equipamentos de madeira.



CAMINHOS ACESSÍVEIS/PEDONAIS:


- Finalização dos nivelamentos, aumentos de cota e compactação de caminhos pedonais em tout venant por toda a freguesia:

- . Rua quinta do Badala – alargamento, nivelamento e compactação do caminho;
 - . Caminho de Aveiro – alargamento, nivelamento e compactação do caminho;
 - . Caminho da Giganta alargamento, nivelamento e compactação do caminho;
 - . Caminho da Rua Conselheiro António José da Rocha;
 - . Caminho da Presa - alargamento, nivelamento e compactação do caminho;
 - . Caminho da Medela - nivelamento e compactação do caminho;
 - . Caminho Rua Padre Manuel dos Santos - nivelamento e compactação do caminho;
 - . Caminhos Florestais de Vale de Ílhavo;
 - . Caminho da Rua da Capela;
- Aumento de cotas com aplicação de tout-venan em diversos caminhos da freguesia;



SINALÉTICA:

- Continuidade na aplicação de placas sinaléticas diversas de locais da Freguesia;
- Limpeza e manutenção de placas de sinalética e toponímia existentes;
- Limpeza de grafitis em estruturas e sinalética;
- Limpeza de matos e vegetação junto as placas de sinalética;
- Renovação e aplicação de placas de toponímia diversas.



OUTROS

Construção e melhoria dos espaços dos Ecopontos:

- . Marcação e construção de novos espaços;
- . Aplicação de novos limites em lancil L8;
- . Construção de bases de assentamento em pavê;
- . Sinalização dos novos espaços.



PARQUE CANINO E PARQUE GIMNICO



Ambos os parques se encontram concluídos.

De destacar que conforme o compromisso da JFSS, apenas o parque canino se encontrava nas propostas iniciais para 2023.

Contudo, e dadas as especificidades do local de implementação surgiu a oportunidade de alargar o investimento e criar no local uma nova área de lazer e desportiva destinada a toda a comunidade.

Assim, surgiu parque gímnico e de lazer como componente adicional a esta obra sendo direcionada parte do investimento previsto no parque da Murteira para este e outra parcela do investimento complementar por parte da JFSS.

No final pensamos e afirmamos esta ter sido uma aposta ganha e de especial valor a toda esta nossa comunidade.

Obra finalizada:

- Finalizada a colocação de terra vegetal e marcação de caminhos/aceessos finais;
- Finalizado o plantio de relva no local;
- Finalizada a colocação de tout venant e pó de pedra para regularização de pisos caminhos de acesso;
- Finalizados ambos os parques;
- Finalizada a aplicação de arbustos e árvores em caldeira;
- Finalizada a aplicação de bancos de madeira de descanso;
- Finalizada a implementação de bebedouros e caixotes do lixo;
- Finalizada a aplicação de outras estruturas essenciais ao equipamento;



ÁRVORES EM CALDEIRA

- Finalizada a aplicação de árvores em caldeira na Freguesia;
- Finalizada a aplicação de arbustos diversos de sombreamento em parques e locais de maior necessidade da freguesia;
- Finalizado o investimento e aplicação de madeiras destinadas ao apoio a árvores estruturas;
- Finalizada a manutenção, corte e poda de árvores e arbustos implementados nos diferentes espaços.



MERCADO DE ÍLHAVO

- Finalizadas as pinturas em estruturas essenciais ao funcionamento do mercado;
- Finalizada a reabilitação de estruturas diversas (wc, espaços comuns e de formação, barraquinhas de madeira, entre outras);
- Finalizada a aquisição de mesas de apoio em madeira para complemento exterior a eventos e funcionamento do mercado;
- Finalizada a aquisição de seis novas bancadas de inox para novas vendedoras(es) no mercado de Ílhavo;
- Finalizadas as manutenções de estruturas e piso do parque Infantil adjacente ao mercado de Ílhavo e parque de autocaravanas no local.



INTERVENÇÃO DE REDES, ÁGUAS PLUVIAIS, VALAS HIDRÁULICAS, SINALÉTICA E ESGOTOS

- Construção de corredores de água em cimento para direcionamento de águas pluviais:
 - . Rua da Lagoinha
 - . Rua da Coutada;
 - . Rua José António Vidal;
 - . Rua principal;
 - . Rua central;
 - . Rua da Coutada;
 - . Rua do Urjal;
 - . Rua Caminho da Presa;
 - . Rua da Carvalheira;
 - . Rua do Paço
 - . Rua das Moitas;
 - . Rua Central;
 - . Rua do Portão Velho;



- Limpeza de valas hidráulicas públicas e substituição de condutas em cimento danificadas;
- Construção e muretes de apoio a valas hidráulicas;
- Limpeza de sarjetas diversas e reposição de estruturas danificadas;
- Limpeza de areias em condutas e tubagens de águas pluviais;
- Substituição de tampas de esgotos e águas pluviais diversas danificadas e/ou furtadas.



PASSEIOS

- Reabilitação de passeios diversos pela freguesia;
- Construção de passeios em diferentes locais da Freguesia;
- Finalização dos passeios do Largo da Capela / Rua da Capela e Rua do Pericão (obra em compromisso);
- Construção de passeio em pavê para bases de Ecopontos e caixotes de lixo comum:



NOTA FINAL

Com a apresentação deste terceiro relatório, queremos ser rigorosos no trabalho que apresentamos.

Uma gestão rigorosa que está relacionada diretamente com a qualidade dos seus intervenientes, pelo que fomos primando nas escolhas que viemos a efetuar durante 2023.

A valorização do capital humano desta autarquia será sempre uma das prioridades do Executivo, ao qual faremos um acompanhamento direto e sempre presente, dando motivação, exigindo dedicação e criando formação.

Continuaremos a privilegiar e segurar as relações com os atores comerciais existentes, não fechando a porta, mas sim abrindo a mesma a novas entradas, sempre que se revelem mais valias para o(s) processo(s) da nossa Junta e em benefício mútuo com o nosso Município.

Queremos atingir níveis de excelência no que diz respeito aos indicadores de satisfação do serviço público prestado, tanto dos nossos fregueses, como de todos os envolvidos nos nossos processos, numa base de muita lealdade e confiança.

Manter a confiança que nos foi depositada, obriga-nos a uma melhoria contínua das tarefas do dia-a-dia.

O nosso compromisso é o de promover uma maior proximidade com os nossos fregueses, daí a nossa aposta em planos de atividades exequíveis e sentidos pelo "pulsar" minuto a minuto da nossa comunidade.

Valorizar a eficiência na gestão da afetação dos recursos públicos, tem por base melhorar a prestação e o reforço da transparência na nossa autarquia.

Um trabalho, um objetivo e um futuro.

Ponto 6. Em anexo, enviamos faturas relativas aos investimentos realizados no âmbito do protocolo com a CMI.

Ílhavo, 08 de dezembro de 2023

O Presidente da Junta de Freguesia de S.
Salvador,



João Eduardo Bonito Braga

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.
